



Collaudo Installazione della stazione fissa

Ente	
Indirizzo	
ISSI Terminale radio	

Prove radio con la Centrale provinciale d'emergenza (CPE)

Prova radio sul talk-group **BETRIEB 0 (BET 0)**

OTTIMO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE

Chiamata individuale (Half-Duplex) della CPE verso la stazione fissa

OK	Non OK

Stato 3 „Intervento preso in carica“ verso la CPE (tasto 3)

OK	Non OK

Richiesta di comunicazione verso la CPE (tasto 5)

OK	Non OK



Stato 2 „Intervento finito – pronto per un altro intervento“ verso la CPE (tasto 2)

OK	Non OK

Antenna e cavo d'antenna


Tipo d'antenna	Yagi ad 1 elemento
Guadagno d'antenna	3 dBi
Direzione	
Cavo d'antenna	RG-8/U – Attenuazione max. 4 dB/100 ft a 400 MHz (<i>possono essere usati cavi equivalenti con caratteristiche uguali o migliori</i>)
Lunghezza del cavo	

Misure della potenza

La misura della potenza deve essere fatto nel **DMO**.

Potenza d'uscita sul conettore d'antenna della radio	
Potenza d'uscita sul conettore d'antenna dell'antenna	

VSWR (ROS) all'uscita del terminale radio	
VSWR (ROS) all'entrata dell'antenna	

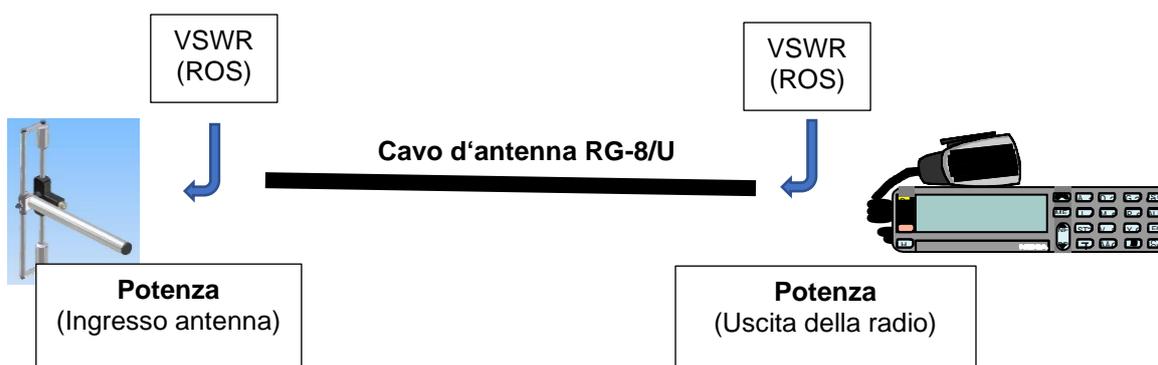

RSSI

Verifica del valore RSSI

Il valore del RSSI può essere verificato con la radio, con la seguente sequenza di tasti.



- Menu: scegliere „Zelleninfo“
- valore RSSI si trova sulla 2° pagina



RSSI	
------	--

Esecuzione

Impresa d'installazione	
Data d'installazione	
Firma	

Tecnico del servizio radiocomunicazione provinciale con cui sono state fatte le prove radio	
--	--



- Le prove radio sono da eseguire con un tecnico del servizio radiocomunicazione provinciale.
- Le prove radio sono da concordare una settimana prima col servizio radiocomunicazione provinciale (indicare il giorno)
- L'ora esatta della prova radio deve essere comunicato 3 ore prima
- Le prove radio con la CPE possono essere fatte soltanto nei giorni lavorativi tra le ore 08:00 e le ore 17:00
- Il foglio del collaudo (compreso gli allegati) deve essere firmato e inviato per mail a landesfunkdienst@provinz.bz.it e anche all'ente/unione provinciale competente dell'utente
- Dopo il collaudo positivo avviene l'attivazione del terminale radio nella CPE

Allegati

- foto dell'antenna installata (vista generale, non immagine di dettaglio)
- foto della struttura (vista generale)
- foto del conettore d'antenna finito (lato antenna – immagine da sopra)
- foto del conettore d'antenna finito (lato terminale radio – immagine da sopra)
- foto del valore RSSI sul Display della stazione fissa
- foto del valore sullo strumento di misura della potenza d'uscita sul conettore d'antenna lato terminale radio
- foto del valore sullo strumento di misura della potenza d'uscita sul conettore d'antenna lato antenna
- foto del valore VSWR (ROS) sullo strumento di misura lato terminale radio
- foto vom VSWR (ROS) a del valore VSWR (ROS) sullo strumento di misura lato antenna
